

การขับเคลื่อนงานส่วนภูมิภาค  
โดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
นายคมสันต์ เลิศสกุลยั้งยืน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาการผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน





# การมอบหมายภารกิจให้สำนักงานพลังงานจังหวัด



การมอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดปฏิบัติการกิจของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้สำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน



ภารกิจ

1

สนับสนุนการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2566 ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มอบหมาย จำนวน 10 กิจกรรม



ภารกิจ

2

ติดตามเร่งรัดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ



ภารกิจ

3

ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในพื้นที่จังหวัดที่ดำเนินการเสร็จแล้ว





# ปัญหาและอุปสรรคและผลการติดตามโครงการปี 2563-2564



## ปัญหา-อุปสรรคที่พบในการติดตามและประเมินผลโครงการ

01

การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุนไม่เป็นไปตามหนังสือยืนยัน

02

การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการและการขอเบิกจ่ายเงินงวด (เอกสารประกอบการเบิกจ่าย)

03

หน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุนดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้



# ปัญหาและอุปสรรคและผลการติดตามโครงการปี 2563-2564



## ผลลัพธ์

ทำให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกตลอดทั้งปี


มีน้ำบาดาลที่สะอาดใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าการสูบน้ำเพื่อการเกษตร

เกิดความสามัคคี  
การแบ่งปันของสมาชิกในชุมชน

ทำให้มีรายได้จากการปลูกพืชแบบหมุนเวียน  
เลี้ยงสัตว์ (วัว หมู ไก่) สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

การใช้พลังงานลดลง ลดการใช้น้ำมันดีเซล





# การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



## ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### 1. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 3,850 ล้านบาท

ล้านบาท

1.1	กลุ่มงานกฎหมาย	100
1.2	กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	250
1.3	กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ	150
1.4	กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร	150
1.5	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	150
1.6	กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ	1,060
1.7	กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก	1,990

(จังหวัดละ 25 ล้านบาท)

### 2. แผนบริหารจัดการ ส.กทอ. 150 ล้านบาท

หมายเหตุ : คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 92) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566





# ความคืบหน้าการพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



## แผนการดำเนินงานกลุ่มงานที่ 1-6

การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
	แผนเดิม	แผนใหม่	
1. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานที่ 1 2 4 5 และ 6	9 ก.พ. 65 – 11 มี.ค. 65	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานที่ 3	8 มี.ค. 65 – 31 มี.ค. 65	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>3. พิจารณากลับกรองข้อเสนอโครงการ กลุ่มงานที่ 1 – 6</b>			
3.1 ส.กทอ. คัดแยกข้อเสนอโครงการ กลุ่มงานที่ 1 – 6	11 มี.ค. 65 – 30 พ.ค. 65	มี.ค. 65 - เม.ย. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอโครงการ กลุ่มงานที่ 1-6 และ ส.กทอ. พิจารณาตามมาตรฐานราคากลาง กลุ่มงานที่ 1 2 4 และ 5		1 – 31 พ.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.3 คณะทำงานพิจารณากลับกรองฯ และการพิจารณาตามมาตรฐานราคากลาง กลุ่มงานที่ 3		31 พ.ค. 65 – 5 ก.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.4 คณะทำงานพิจารณากลับกรองฯ การพิจารณาตามมาตรฐานราคากลาง กลุ่มงานที่ 6		7 มิ.ย. 65 – 23 มิ.ย. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ



# ความคืบหน้าการพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



## แผนการดำเนินงานกลุ่มงานที่ 1-6

การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
	แผนเดิม	แผนใหม่	
<b>4. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลับกรองข้อเสนอโครงการ และเสนอความเห็น</b>			
4.1 คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาฯ กลุ่มงานที่ 1 2 4 และ 5	1 มิ.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65	23 มิ.ย. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2 คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณากลับกรองข้อเสนอโครงการ กลุ่มงานที่ 1 2 4 และ 5 พิจารณาผลการทบทวนโครงการตามมติของคณะกรรมการกองทุนฯ ข้อ 4.1 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 และพิจารณากลับกรองข้อเสนอโครงการ กลุ่มงานที่ 3 และกลุ่มงานที่ 6		-	รอการพิจารณา
5. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	ภายในเดือน ก.ค. 65	ภายในเดือน ส.ค. 65	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6. แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อผู้ได้รับการสนับสนุน (ภายใน 7 วันนับตั้งแต่คณะกรรมการกองทุนฯ มีมติ)	ภายในเดือน ส.ค. 65	ภายในเดือน ก.ย. 65	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7. ผู้ได้รับการสนับสนุนลงนามในหนังสือยืนยัน	ภายในเดือน ส.ค. 65	ภายในเดือน ก.ย. 65	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8. วันเริ่มต้นโครงการ	1 ก.ย. 65	1 ต.ค. 65	



# ความคืบหน้าการพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



## แผนการดำเนินงานกลุ่มงานที่ 7

การดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	แผนเดิม	แผนใหม่	
1. ส.กทอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กลุ่มงานเศรษฐกิจฐานรากฯ ประจำปีงบประมาณ 2565	8 มี.ค. 65 - 30 เม.ย. 65	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ส.กทอ. คัดแยกข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก ก.บ.จ. (ขั้นตอนที่ 1)	10 พ.ค. 65		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. ส.กทอ. ส่งผลการคัดแยกข้อเสนอโครงการ ให้แก่ สพจ. เพื่อยืนยันผลการคัดแยกข้อเสนอโครงการ	15 พ.ค. 65		ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. สพจ. ส่งหนังสือเพื่อยืนยันผลการคัดแยกข้อเสนอโครงการ ให้แก่ ส.กทอ.	ภายใน 25 พ.ค. 65		ดำเนินการแล้วเสร็จ
5. ส.กทอ. เสนอผลการคัดแยกข้อเสนอโครงการ ต่อคณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ (กลุ่มงานที่ 7) พิจารณาเห็นชอบ	10 มิ.ย. 65		ดำเนินการแล้วเสร็จ
6. ส.กทอ. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร (ขั้นตอนที่ 2) และมาตรฐานราคาอ้างอิง เทคโนโลยี (ขั้นตอนที่ 3)	ภายใน 30 มิ.ย. 65	ภายใน 20 ก.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. ส.กทอ. จัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ (กลุ่มงานที่ 7) พิจารณาเห็นชอบ	8 ก.ค. 65	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8. ส.กทอ. จัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ (กลุ่มงานที่ 7) พิจารณาเห็นชอบ	-	21 ก.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9. ส.กทอ. เสนอผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ต่อ คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ	25 ก.ค. 65	ภายในเดือน ส.ค. 65	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10. ส.กทอ. แจ้งมติผู้ได้รับการสนับสนุน (ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่คณะกรรมการมีมติ)	1 ส.ค. 65	ภายในเดือน ก.ย. 65	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11. ผู้ได้รับการสนับสนุนลงนามในหนังสือยืนยัน (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งมติจาก ส.กทอ.)	ภายใน 31 ส.ค. 65	ภายในเดือน ก.ย. 65	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12. วันเริ่มต้นโครงการ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก	1 ก.ย. 65	1 ธ.ค. 65	





# ความคืบหน้าการพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ผลการพิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอโครงการ กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ (กลุ่มงานที่ 7)

กลุ่มงาน	กรอบวงเงิน (ล้านบาท)	ผ่านการพิจารณา จาก ก.บ.จ.		หน่วยงานยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กองทุนฯ			เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข		
		จำนวน จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	ระบบ	งบประมาณที่ ยื่นขอ (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	ระบบ	งบประมาณที่ควร ให้การสนับสนุน (ล้านบาท)
กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทน เศรษฐกิจฐานราก	1,900	*75	1,352.23	1,133	7,409	1,230.29	983	5,214	870.98

หมายเหตุ : \* จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่มีหน่วยงานยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

กลุ่มงานที่ 7 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอนำข้อมูลดังกล่าว เสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป



# การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



## ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### 1. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 1,850 ล้านบาท

ล้านบาท

1.1	กลุ่มงานกฎหมาย	70
1.2	กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	100
1.3	กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ	200
1.4	กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร	35
1.5	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	35
1.6	กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ	650
1.7	กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก	760

(จังหวัดละ 10 ล้านบาท)

### 2. แผนบริหารจัดการ ส.กทอ. 150 ล้านบาท

หมายเหตุ : คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 94) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



# กรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดสรรเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน

การปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ	มี.ค. 65
2. เสนอร่างยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อมีมติให้ความเห็นชอบ	11 เม.ย. 65
3. เสนอยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อมีมติให้ความเห็นชอบ	1 มิ.ย. 65
4. ส.กทอ. เปิดให้ยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน	ประกาศ 6 มิ.ย. 65 เปิดรับ Admin วันที่ 8 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65
5. ส.กทอ. ประกาศยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนฯ และประกาศรับข้อเสนอโครงการ	ประกาศ 6 มิ.ย. 65 เปิดรับ กลุ่มงานที่ 1-6 วันที่ 1-30 ก.ค. 65 กลุ่มงานที่ 7 วันที่ 1-30 ก.ย. 65
6. ส.กทอ. รวบรวมคำขอและจัดทำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา	กลุ่มงานที่ 1-6 ภายใน ส.ค. 65 กลุ่มงานที่ 7 ภายใน พ.ย. 65
7. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่ออนุมัติโครงการ	กลุ่มงานที่ 1-6 ภายใน ก.ย. 65 กลุ่มงานที่ 7 ภายใน ธ.ค. 65
8. แจ้งมติผู้ได้รับการสนับสนุน (ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่คณะกรรมการกองทุนฯ มีมติ)	กลุ่มงานที่ 1-6 ภายใน ต.ค. 65 กลุ่มงานที่ 7 ภายใน ม.ค. 66
9. ผู้ได้รับการสนับสนุนลงนามในหนังสือยืนยันภายใน 30 วัน	กลุ่มงานที่ 1-6 ภายใน พ.ย. 65 กลุ่มงานที่ 7 ภายใน ก.พ. 66
10. ประชุม คณะอนุกรรมการบริหาร ส.กทอ. เพื่ออนุมัติแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปี	ภายใน 31 ก.ค. 65
11. ส่งแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปี 2565 ให้กระทรวงการคลัง ก่อนวันเริ่มต้นโครงการ 30 วัน	ภายใน 31 ส.ค. 65
12. วันเริ่มต้นโครงการ	กลุ่มงานที่ 1-6 วันที่ 1 ธ.ค. 65 กลุ่มงานที่ 7 วันที่ 1 มี.ค. 66

หมายเหตุ : กลุ่มงานที่ 7 สำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) ส่งผลการพิจารณาและเห็นชอบข้อเสนอโครงการจาก ก.บ.จ. พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ให้แก่ ส.กทอ. ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565



# การประชาสัมพันธ์การจัดสรรเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566




## ดำเนินการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด



### สถานที่จัดประชุม 8 จังหวัด

ขอนแก่น	8-9	มิถุนายน	2565
อุบลราชธานี	16-17	มิถุนายน	2565
พิษณุโลก	28-29	มิถุนายน	2565
นครนายก	7-8	กรกฎาคม	2565
ราชบุรี	11-12	กรกฎาคม	2565
สุราษฎร์ธานี	18-19	กรกฎาคม	2565
สงขลา	20-21	กรกฎาคม	2565
เชียงใหม่	9-10	สิงหาคม	2565

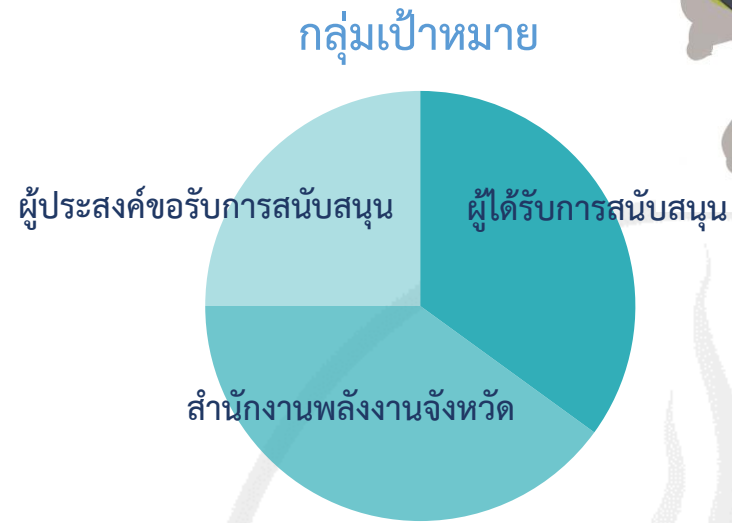

### หัวข้อการประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนและการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

1. แนวทางการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560
3. การยื่นสมัครลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน และการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. การดำเนินโครงการ การส่งรายงานความก้าวหน้าตามเงื่อนไขในหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
5. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
6. การเบิกจ่ายเงินกองทุน การจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุน การปิดโครงการ การปิดบัญชี



Thank You

Energy vs

CLIMATE

